

A街区新築 作業予定のお知らせ

令和4年9月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業



A街区新築場所



構造：鉄筋コンクリート造 4階建て
建物用途：図書館
工期：2022.5.27～2024.2.29

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせ致します。
作業上、工事車両の往來があります。現場出入時は、誘導員を配置して
工事車両の誘導を致します。ご協力宜しくお願いします。

施工状況



1工区 基礎型枠建込み状況



3・4工区 地足場組立状況

9月1日～9月17日の工事内容

基礎工事

○1工区
基礎型枠組立・解体
基礎コンクリート
地足場解体

○2工区
基礎配筋・圧接
基礎型枠組立・解体
基礎コンクリート
地足場解体
埋戻し

○3工区
地足場組立・解体
基礎配筋・圧接
基礎型枠組立・解体
ピット底盤コンクリート


○4工区
地足場組立
杭頭補強筋溶接
基礎配筋・圧接
基礎型枠組立

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体

B街区新築 作業予定のお知らせ

令和4年9月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業

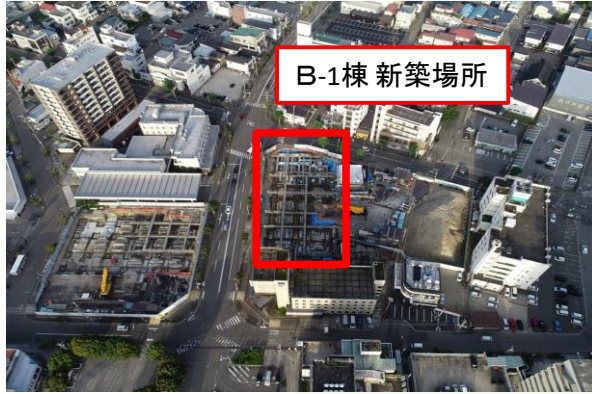

構造：鉄骨造 7階建て
建物用途：事務所、ホテル
工期：2022.6.1～2023.7.31

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせ致します。
作業上、工事車両の往来があります。現場出入時は、誘導員を配置して
工事車両の誘導を致します。ご協力宜しく申し上げます。

施工状況



1工区 埋戻し状況



3工区 基礎配筋・圧接状況

9月1日～9月17日の工事内容

基礎工事

○1工区
埋戻し・山留撤去

○2-1工区
地足場解体
基礎型枠解体
埋戻し

○2-2工区
基礎配筋・圧接
基礎型枠組立・解体
基礎コンクリート

○3工区
基礎配筋
基礎型枠組立・解体
基礎コンクリート
地足場解体・埋戻し

工事に関するお問い合わせは、
下記に連絡願います。

現場代理人：阿部 芳和
現場事務所TEL：0182-23-7733

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体
