

B街区新築 作業予定のお知らせ

令和5年2月


横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業



構造：鉄骨造 7階建て
建物用途：事務所、ホテル
工期：2022.6.1～2023.7.31

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせ致します。
作業上、工事車両の往来があります。現場出入時は、誘導員を配置して
工事車両の誘導を致します。ご協力宜しくお願いします。

施工状況

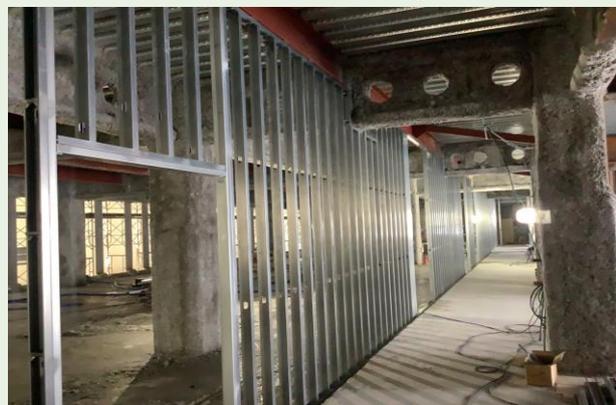

2階 壁下地取付状況



1階 現場発泡ウレタン吹付状況

2月16日～2月28日の工事内容

○内部 エレベーター・階段足場組立

○1階 現場発泡ウレタン吹付
壁下地取付
アルミサッシ取付

○2階 現場発泡ウレタン吹付
耐火被覆材吹付
壁下地取付・ボード張り
アルミサッシ取付

○3階 外壁取付
耐火被覆材吹付
アルミサッシ取付

○4階 外壁下地金物・外壁取付

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体
